

ID	Režim úlohu	Název úlohu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	✖	Zřízení energetické náročnosti budovy obecného domu	238 dny	1.4.22	26.2.23
2	✖	Zateplení plochy obvodového pláště	233 dny	1.4.22	21.2.23
3	✖	Zemné práce	13 dny	23.12.22	10.1.23
4	✖	Zakládání	8 dny	11.1.23	20.1.23
5	✖	Konstrukce vodorovné	7 dny	13.2.23	21.2.23
6	✖	Komunikácie	15 dny	23.1.23	10.2.23
7	✖	Úpravy povrchov, podlahy	180 dny	15.4.22	22.12.22
8	✖	Buracie práce	10 dny	1.4.22	14.4.22
9	✖	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 dny	13.9.23	14.2.23
10	✖	Konstrukcie klampárske	20 dny	23.12.22	19.1.23
11	✖	Zateplenie plochy strešného pláště	132 dny	11.4.22	11.10.22
12	✖	Izolácie tepelné	30 dny	22.6.22	2.8.22
13	✖	Konstrukcie tesniace	35 dny	11.4.22	27.5.22
14	✖	Konštrukcie klampárske	59 dny	9.8.22	11.10.22
15	✖	Vrchný vrstev	2 dny	20.6.22	21.6.22
16	✖	Konstrukcie izolácie	15 dny	30.5.22	17.6.22
17	✖	Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie	140 dny	23.2.22	11.11.22
18	✖	Konstrukcie doplnkové kovové Doleňčovickej práce	75 dny	30.5.22	9.8.22
19	✖	Konstrukcie izolácie	20 dny	2.5.22	27.5.22
20	✖	Ostatné konštrukcie a práce - buracie	149 dny	12.9.22	11.11.22
21	✖	Zateplenie konštrukcie pedah	45 dny	16.5.22	7.12.22
22	✖	Zemné práce	25 dny	18.7.22	19.8.22
23	✖	Zakládanie	20 dny	22.6.22	16.9.22
24	✖	Komunikácie	5 dny	22.6.22	26.8.22
25	✖	Úpravy povrchov, podlahy	40 dny	13.10.22	7.12.22
26	✖	Ostatné konštrukcie a práce - buracie	45 dny	16.5.22	15.7.22
27	✖	Izolácie proti vode a vlhkosti	10 dny	19.9.22	30.9.22
28	✖	Izolácie tepelné	8 dny	3.10.22	12.10.22
29	✖	Ostatné práce	46 dny	7.11.22	9.1.23
30	✖	Zemné práce	3 dny	28.11.22	30.11.22
31	✖	Zakládanie	9 dny	1.12.22	13.12.22
32	✖	Zväčšenie konštrukcie	3 dny	14.12.22	16.12.22
33	✖	Konstrukcie vodorovné	6 dny	19.12.22	26.12.22
34	✖	Úpravy povrchov, podlahy	10 dny	27.12.22	9.1.23
35	✖	Ostatné konštrukcie a práce - buracie	15 dny	7.11.22	25.11.22
36	✖	Zdravotníctva	34 dny	1.12.22	26.2.23
37	✖	UK	70 dny	14.11.22	17.2.23
38	✖	Prípravná práca	15 dny	1.11.22	21.11.22
39	✖	Elektronizácia	68 dny	13.11.22	28.2.23
40	✖	Vzdúchotechnika	55 dny	12.12.22	24.2.23

[Handwritten signature]

Metrostav Slovakia a.s.
 Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26
 IČO 47 144 190
 (2)

Úloha Rozdelení Mlnk

Projekt: Rétó.OD Btkovce

Souhrny
 Souhrn projektu
 Neaktívni úlohu

Neaktívni mlnk
 Neaktívni saubm
 Ruční úlohu


Pouze s dobou trvání
 Ruční úlohu zahrnuje v seznamem úlohu
 Ruční saubm

Pouze zahájení
 Pouze s datem dokončení
 Voľný úlohu

Voľný mlnk
 Keďkoľ termín
 Problém

Problém veľkosti zadávneho úlohu

Stránka 1

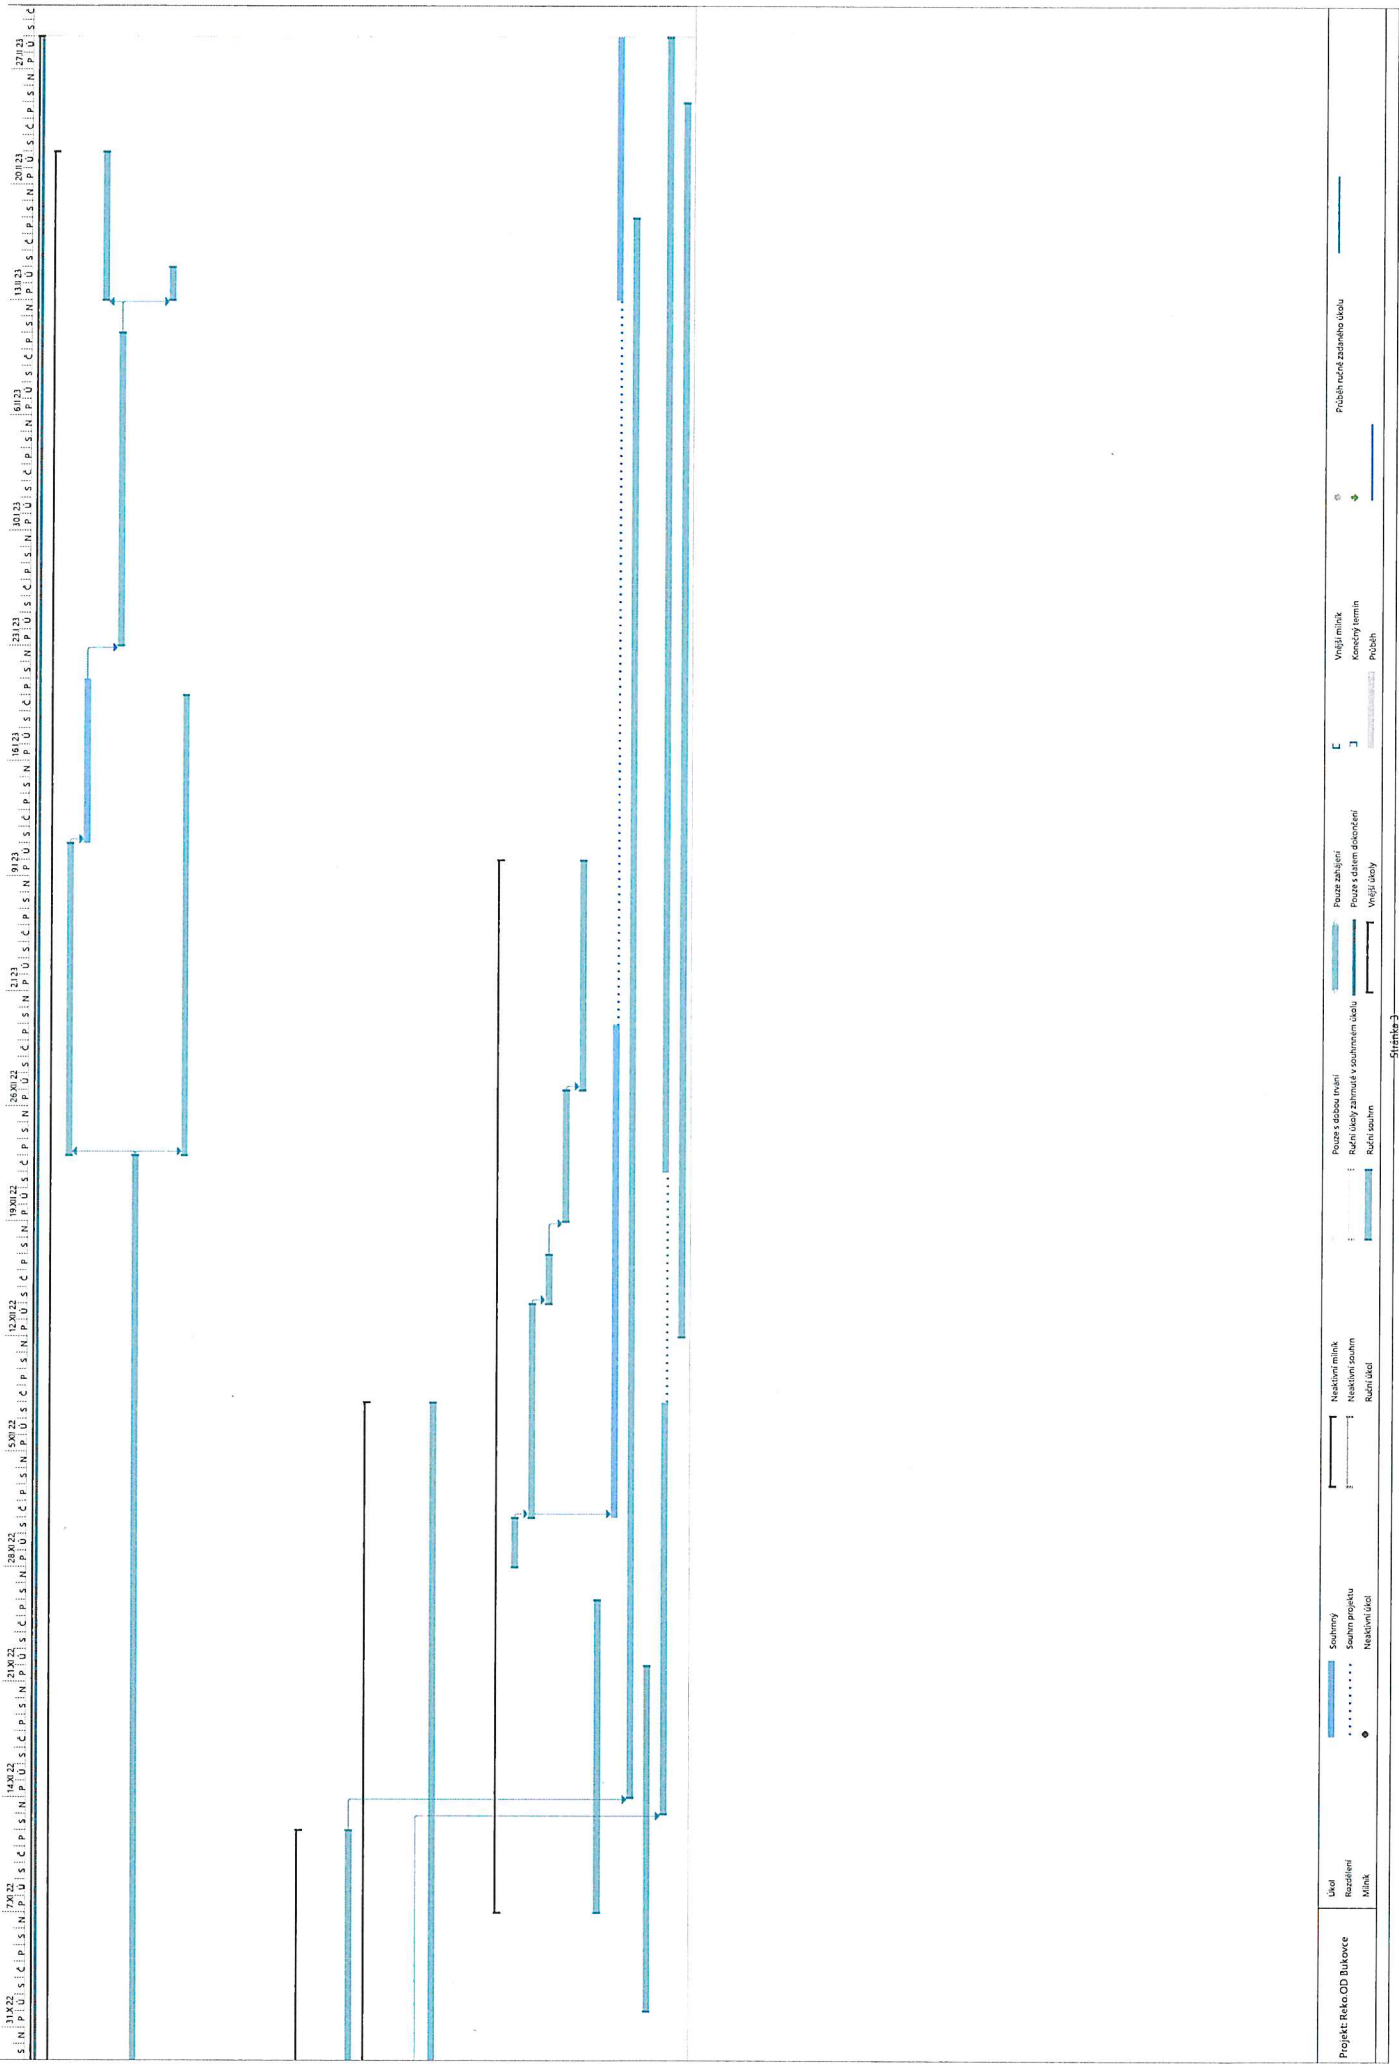

Účel: Účel
 Realizace: Realizace
 Mělk: Mělk

Projekt: Projekt

Souhrny: Souhrny
 Souhrny projektu: Souhrny projektu
 Neaktivní účel: Neaktivní účel

Neaktivní mílek: Neaktivní mílek
 Neaktivní souhrn: Neaktivní souhrn
 Ruční úkol: Ruční úkol

Pouze s dobou trvání: Pouze s dobou trvání
 Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu: Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
 Ruční souhrn: Ruční souhrn

Pouze zahrnutí: Pouze zahrnutí
 Pouze s datem dokončení: Pouze s datem dokončení
 Vnější úkoly: Vnější úkoly

Vnější mílek: Vnější mílek
 Konečný termín: Konečný termín
 Půběh: Půběh

Půběh podle zadávacího úkolu: Půběh podle zadávacího úkolu
